


Software Engineering Conference Russia  
October 2017, St. Petersburg



# Соблюдение сроков в Agile


Алексей Лосев, ООО Логрокон


## Немножко о себе


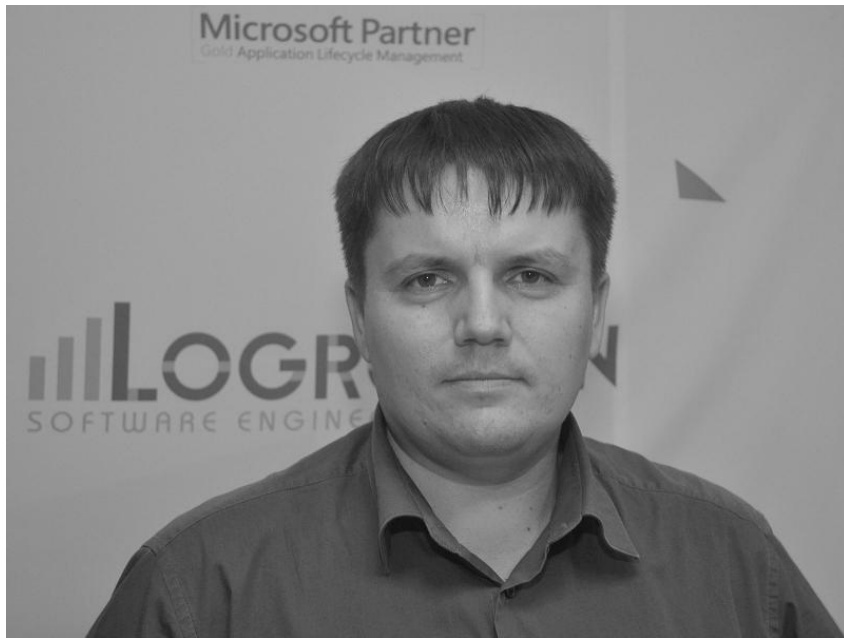



- С 1999 года программирую за деньги;
- С 2003 по 2011 преподавал программирование;
- С 2007 руковожу командами разработчиков;
- В настоящее время – Директор по разработке в компании “Логрокон”;








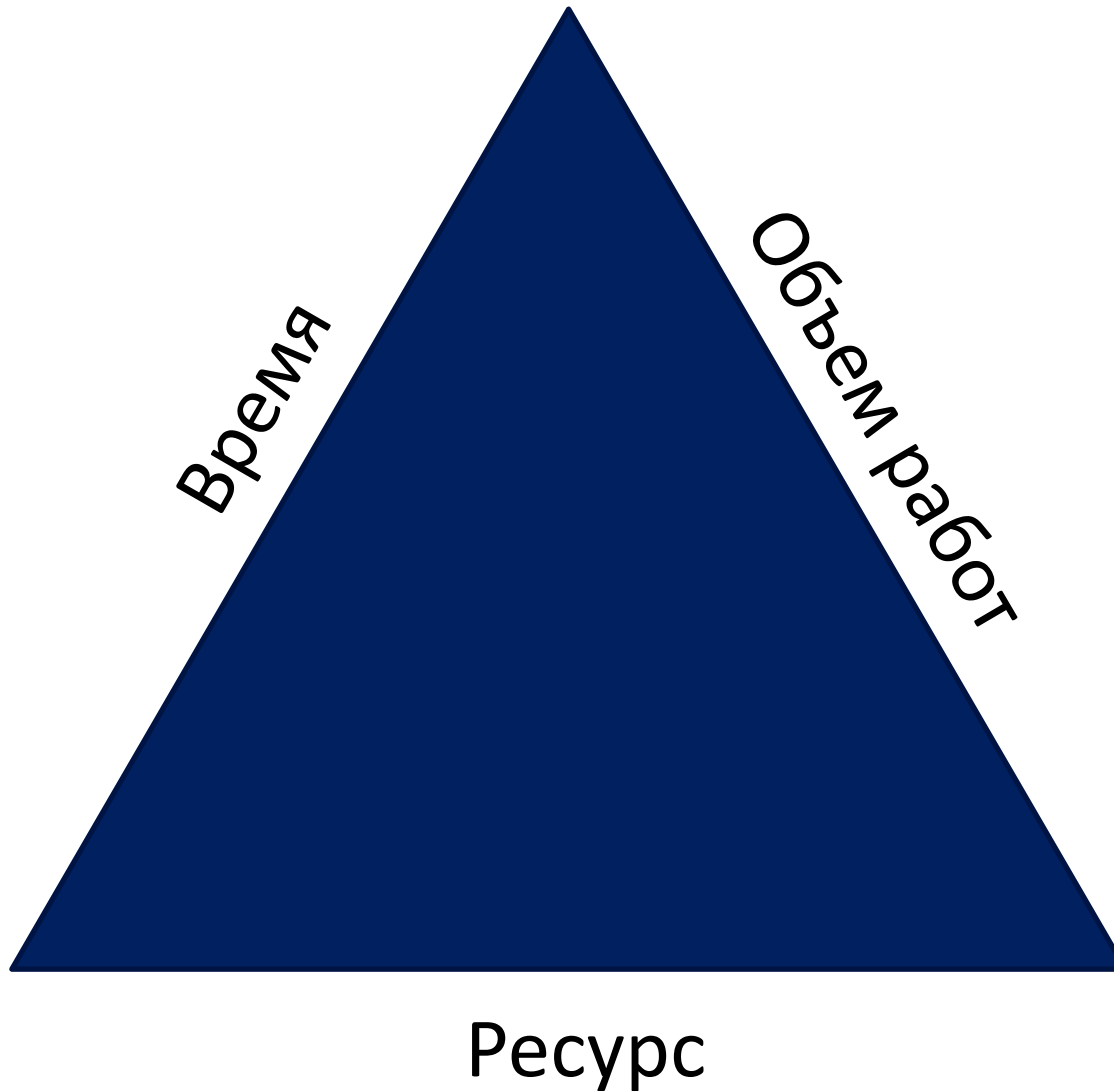




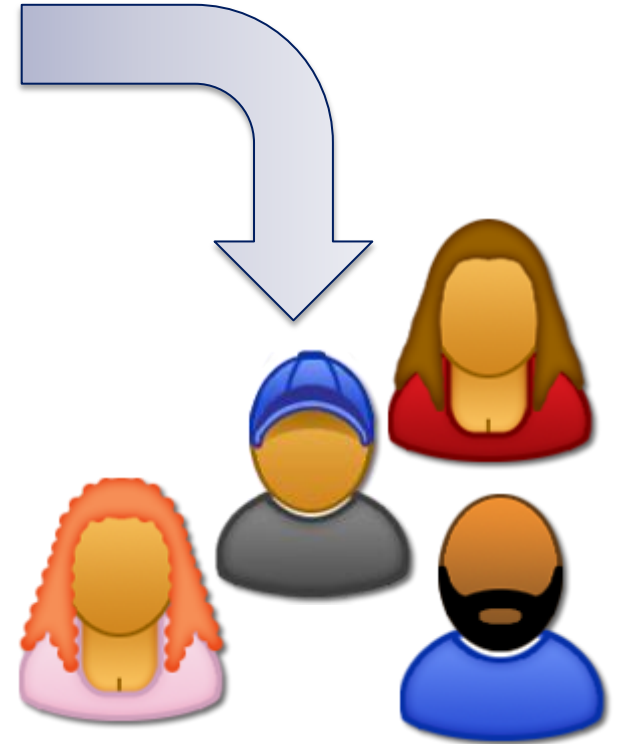


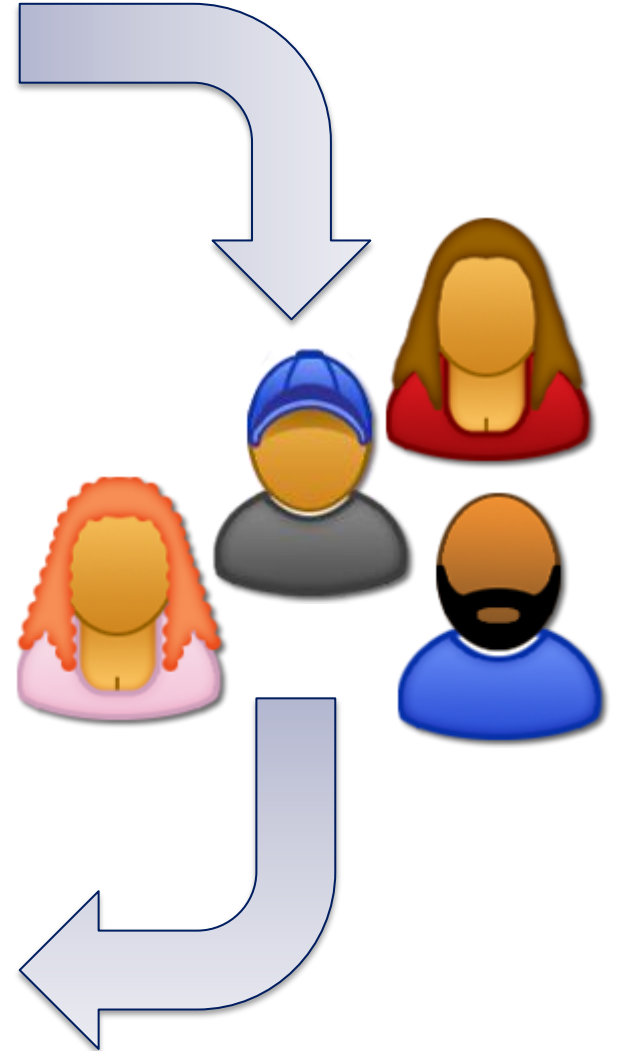

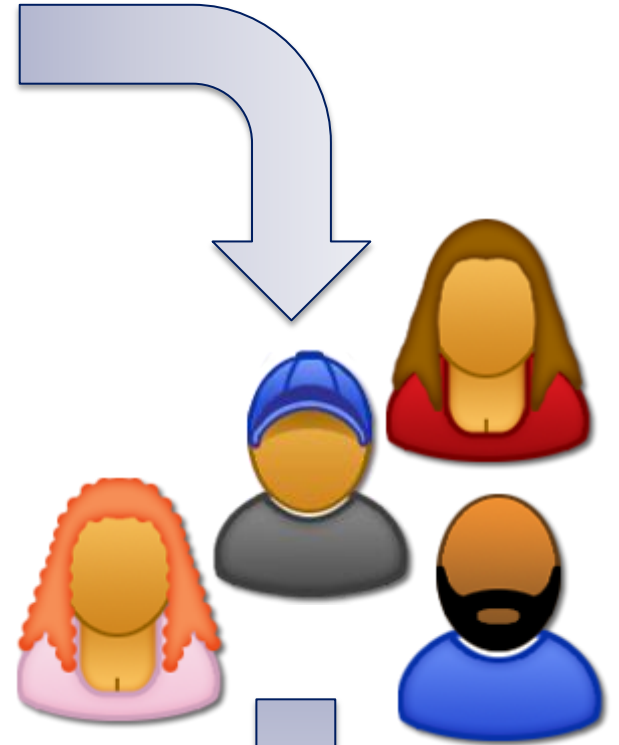

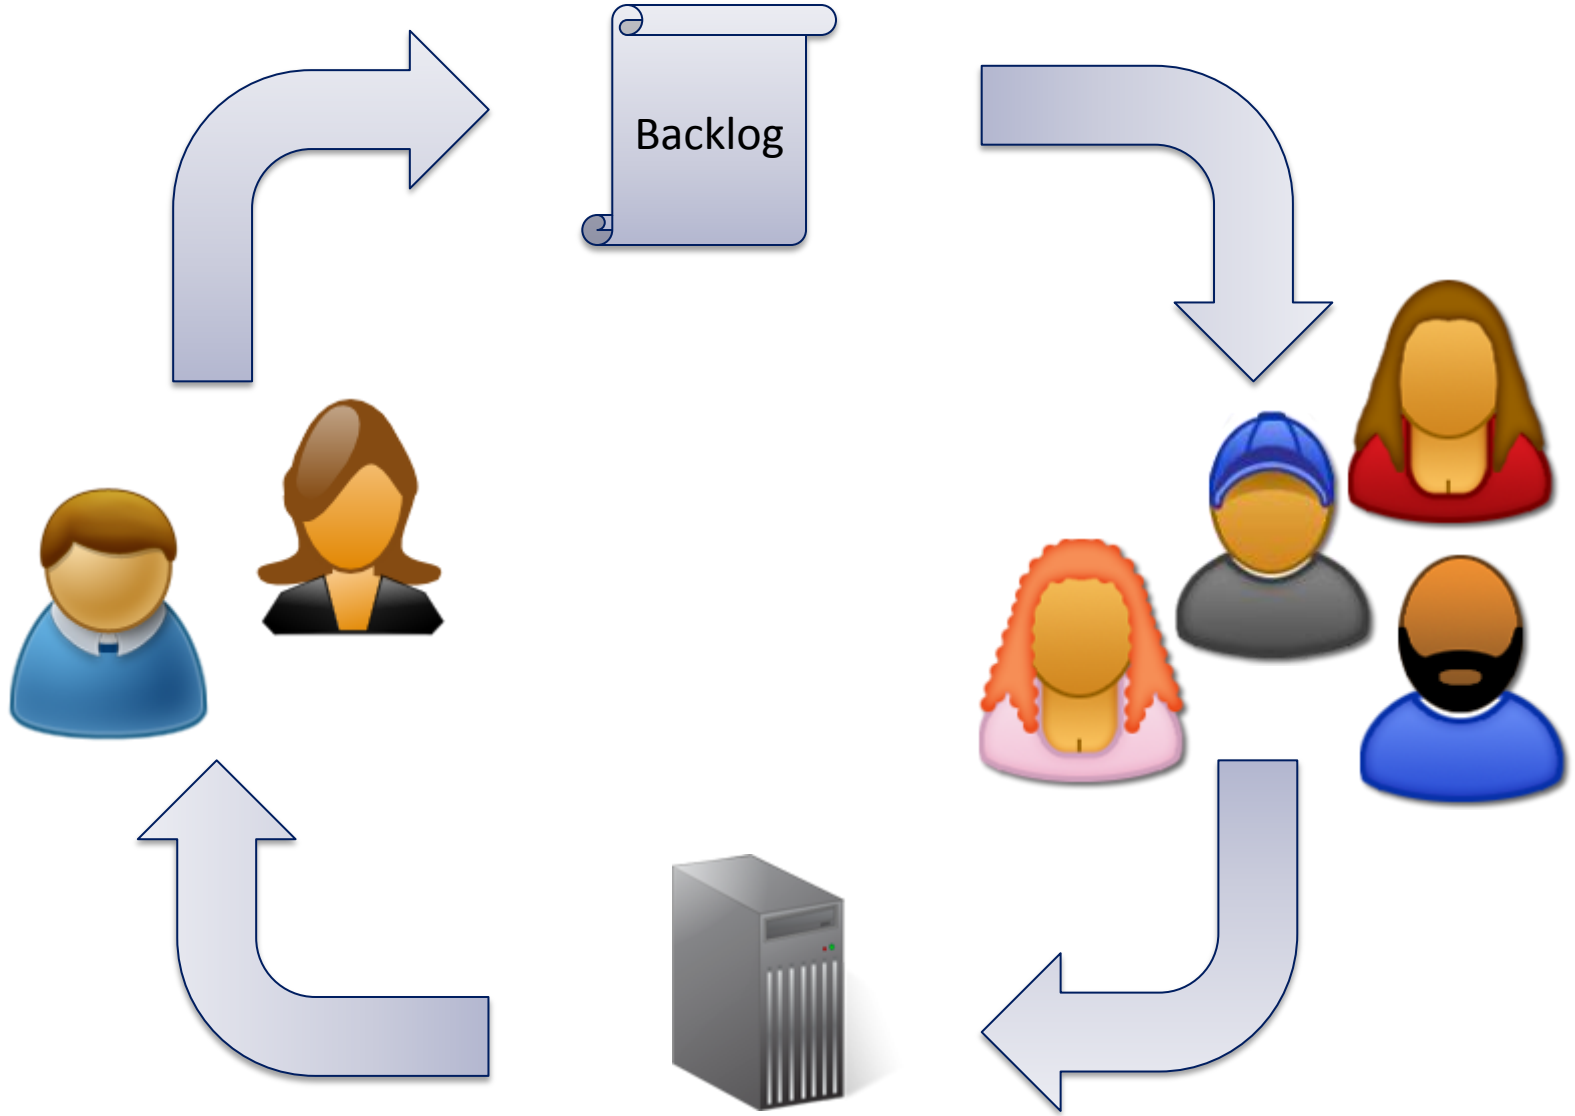




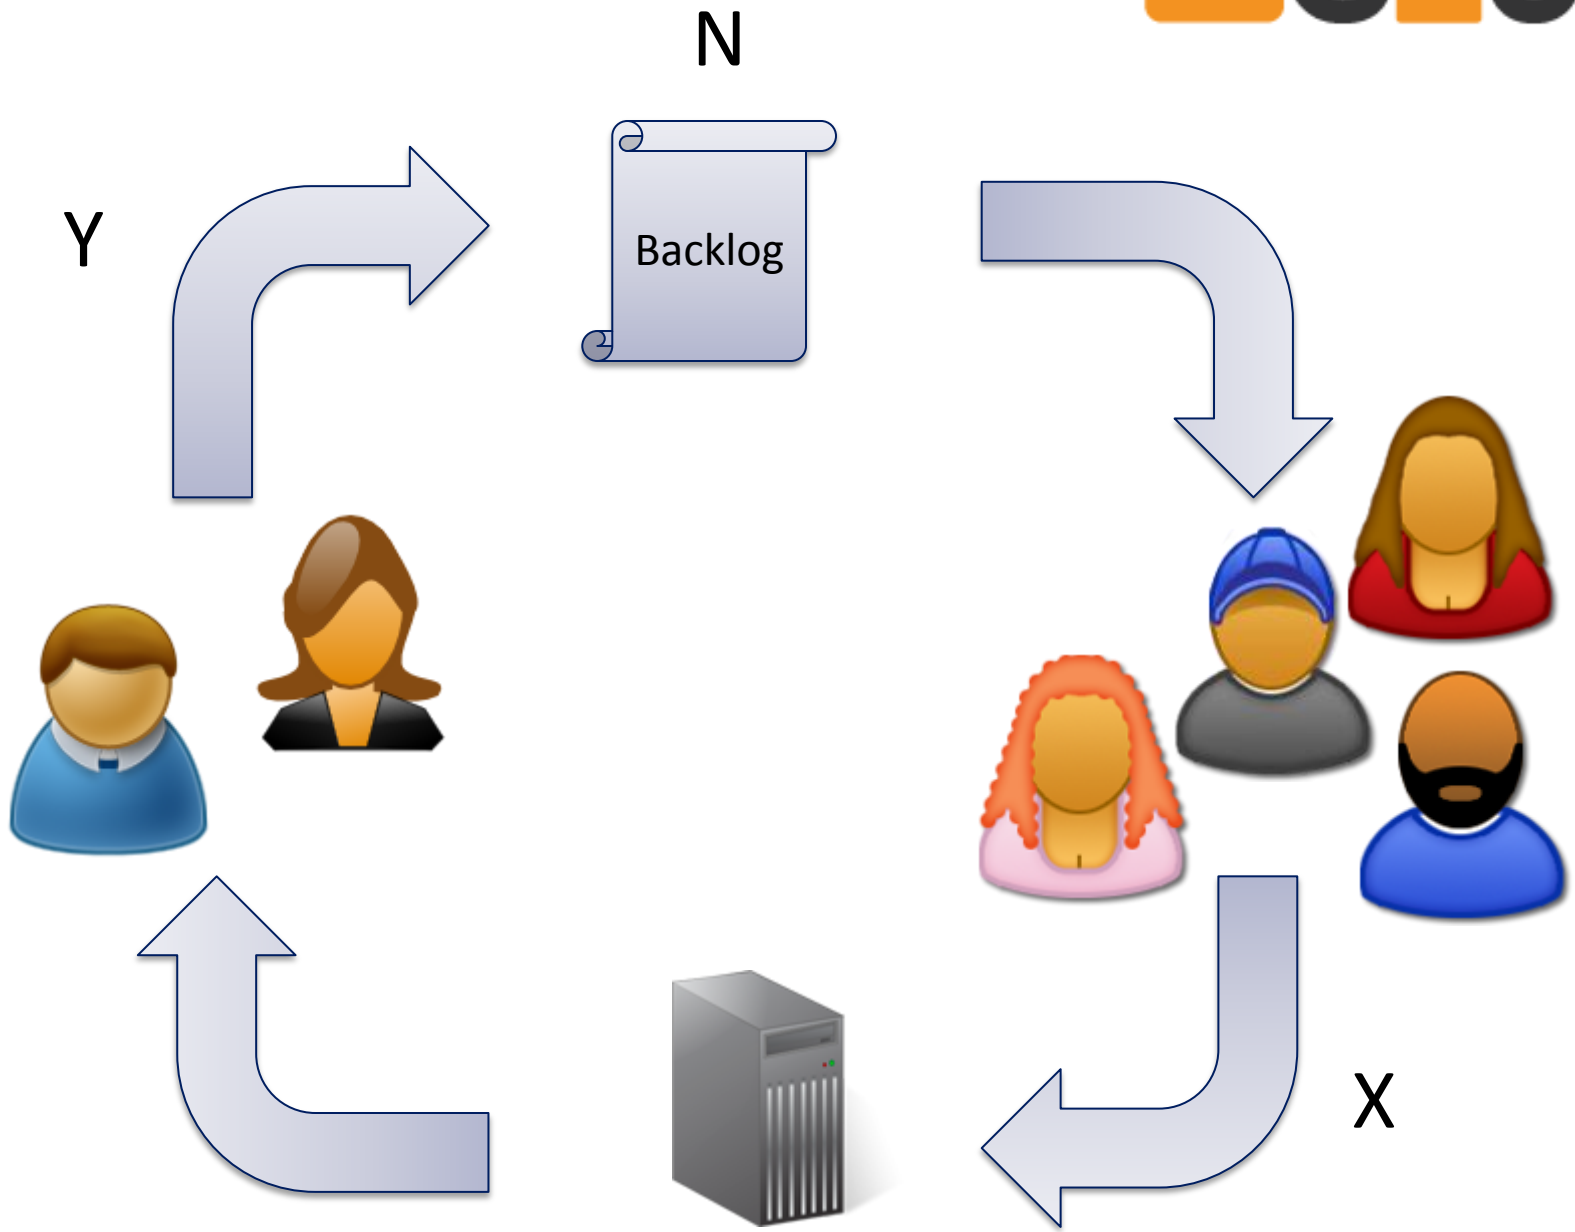



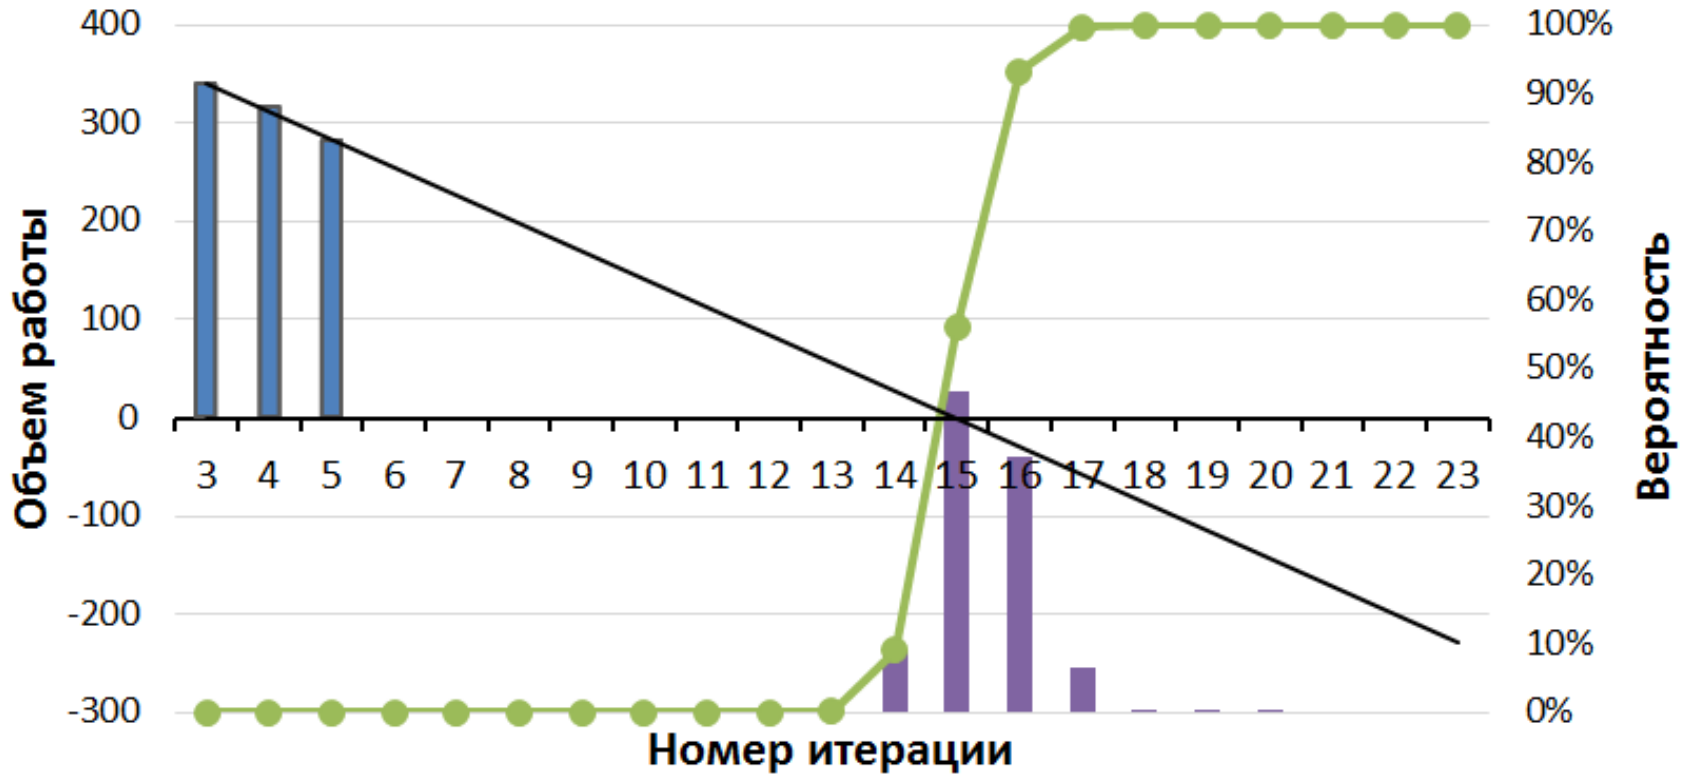

По...	Work Item Type	Title	Story Points
4	Epic	▸ управление проектом	
5	Epic	▸ Приёмка	
6	Epic	▸ Интеграция с внешними системами	
	Feature	▸ Интеграция с [redacted]	
	User Story	▸ Перенести кодовую базу	30
	User Story	▸ Интеграция с [redacted] через Api	5
	User Story	▸ История ТИ. отображение изменения геометрии	2
	User Story	▸ [Analytics] Аналитика, прототипирование. Интеграция с [redacted]	5
	Feature	▸ Интеграция с АСУ [redacted]	
	Feature	▸ Интеграция с АСУ [redacted]	
	Feature	▸ Интеграция с [redacted]	
	Feature	▸ Интеграция с АИС [redacted]	
	Feature	▸ Интеграция с АСУ [redacted]	
	Feature	▸ Интеграция с [redacted]	
	Feature	▸ Интеграция с АС АС [redacted]	
	Feature	▸ Интеграция с ОАО [redacted]	
	Feature	▸ Интеграция с ООО [redacted]	
	Feature	▸ Интеграция с ГУП [redacted]	
	Feature	▸ Интеграция с АСУ [redacted]	
	Feature	▸ Интеграция с [redacted]	
7	Epic	▸ Визуализация данных	
8	Epic	▸ CRM	
9	Epic	▸ Администрирование	
10	Epic	▸ Модернизация проекта для обеспечения работоспособности на различных региональных площадках	

## Расширенная диаграмма выгорания работ



-  - объем backlog-а
-  - вероятность завершения в конкретную итерацию
-  - кумулятивная вероятность завершения к итерации
-  - линейная аппроксимация изменения объема backlog-а



Теги Add9 x AI2 x must\_have x Добавить...

Интеграция с [redacted] 826

DETAILS ACCEPTANCE CRITERIA STORYBOARDS IMPLEMENTATION (2) TEST CASES ALL LINKS (3) ATTACHMENTS HISTORY



1. Заменить адрес на 2 поля - adr и adr2 из xml  
 2. Сохранить отдельно тип действия ограничения из xml  
 3. Сохранить координаты Point  
 4. Сохранить координаты Line  
 5. Добавить уточнение срока ограничения из xml

```

<!-- Типы ограничений -->
"ogr" <!-- Действующее ограничение движения -->
"ogr1" <!-- Планируемое ограничение движения -->
"ogr2" <!-- Просроченное и не снятое ограничение движения -->
"ogr3" <!-- Действующее ограничение движения в ночное время-->
"ogr4" <!-- Планируемое ограничение движения в ночное время-->
"ogr5" <!-- Просроченное и не снятое ограничение движения в ночное время-->
  
```



**STATUS**

Assigned To [redacted]  
 State [redacted]  
 Reason Acceptance tests pass


**PLANNING**

Story Type [dropdown]  
 Story Points 2  
 Priority 2  
 Risk [dropdown]

**CLASSIFICATION**


Area [redacted]  
 Iteration [redacted]  
 Value area Business



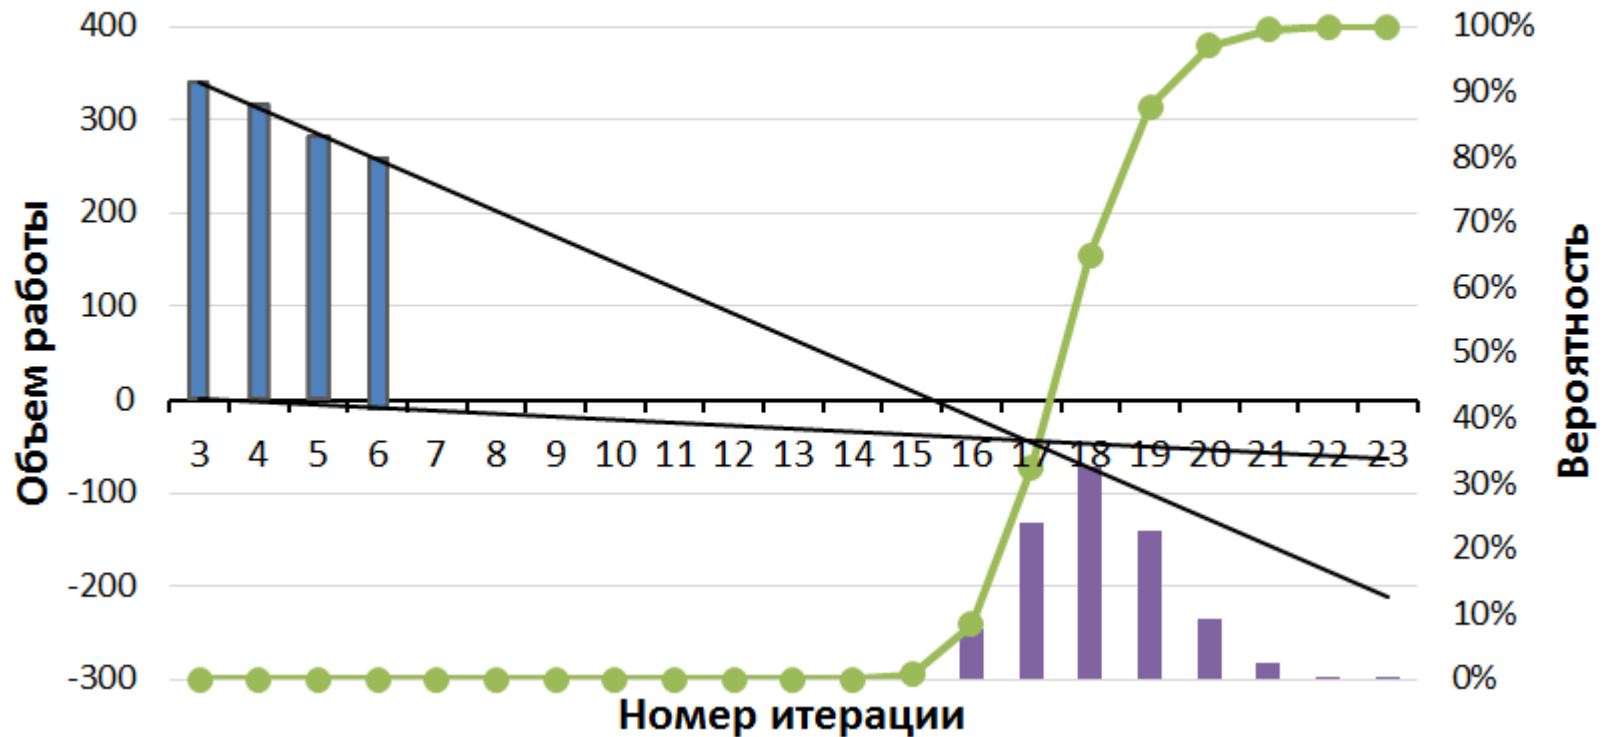

## Расширенная диаграмма выгорания работ

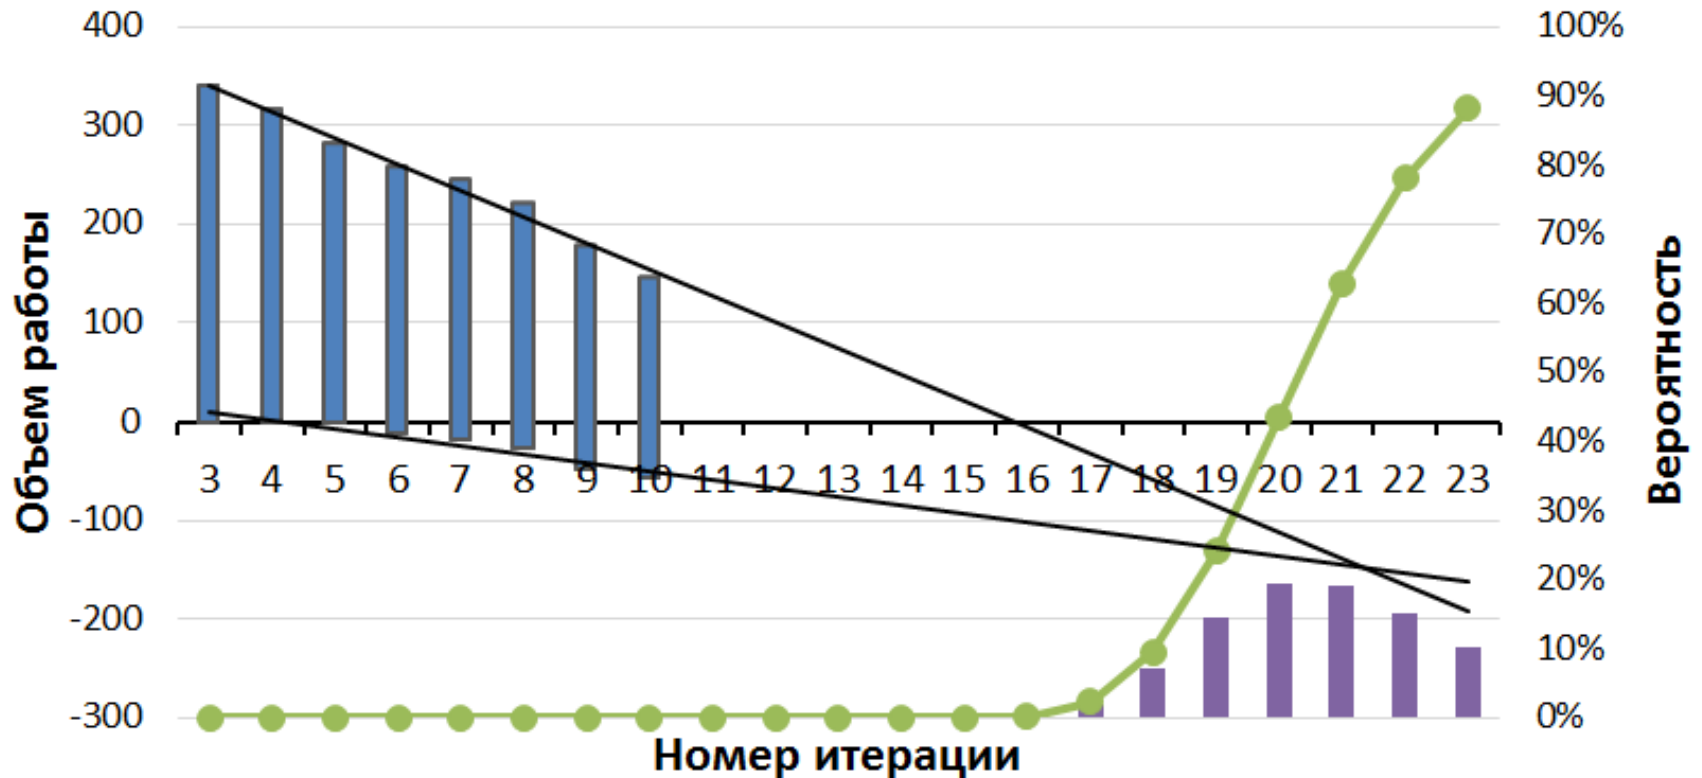


- объем backlog-а
- вероятность завершения в конкретную итерацию
- кумулятивная вероятность завершения к итерации
- линейная аппроксимация изменения объема backlog-а





## Расширенная диаграмма выгорания работ

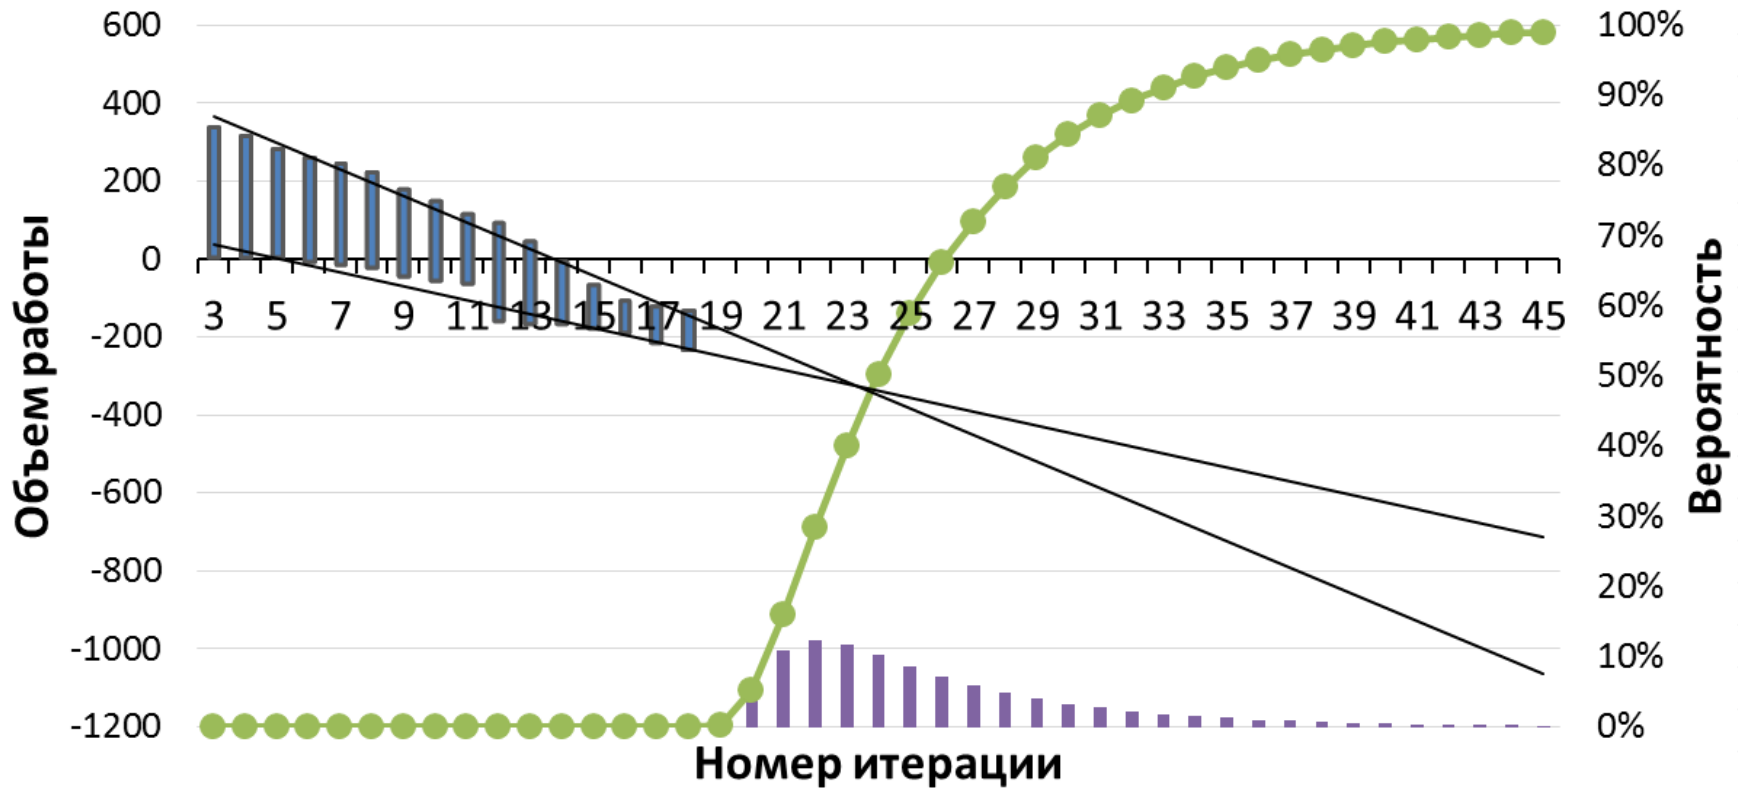

-  - объем backlog-a
-  - вероятность завершения в конкретную итерацию
-  - кумулятивная вероятность завершения к итерации
-  - линейная аппроксимация изменения объема backlog-a

## Расширенная диаграмма выгорания работ



-  - объем backlog-a
-  - вероятность завершения в конкретную итерацию
-  - кумулятивная вероятность завершения к итерации
-  - линейная аппроксимация изменения объема backlog-a

- **Люди и взаимодействие** важнее процессов и инструментов;
- **Работающий продукт** важнее исчерпывающей документации;
- **Сотрудничество с заказчиком** важнее согласования условий контракта;
- **Готовность к изменениям** важнее следования первоначальному плану.



## Контакты



Logrocon

Mail: [alosev@logrocon.com](mailto:alosev@logrocon.com)

Blog: [Losev-AL.blogspot.com](http://Losev-AL.blogspot.com)

[www.logrocon.ru](http://www.logrocon.ru)

Алексей Лосев

Директор по разработке

+7 495 777-00-84

+7 910 707-80-10
